




# (仮称) かしわら認定こども園ニュース 第6号 こども政策課 2020.3.2



このニュースでは、(仮称) かしわら認定こども園について随時お知らせしていきます。

\*\*\*\*\* 2月の進捗状況 \*\*\*\*\*  
2月の工事の様子です。基礎・地中梁配筋、検査、基礎型枠組、基礎コンクリート打設、土埋戻し等がされました。

2/1



2/14



2/18




2/21



2/26



配筋検査

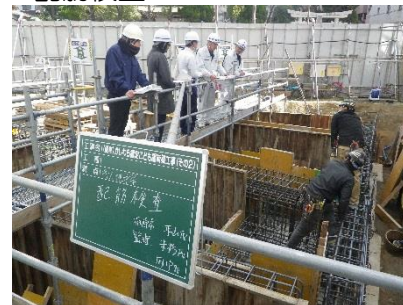

\*\*\*\*\* 3月の月間工程表 \*\*\*\*\*  
月間工程表は以下のとおりです。作業進捗によって変更の可能性があります。  
作業時間：8:30～18:00

3月初旬	ピット内部工事
	土・地業工事
	外部雨水排水工事
	ハンドホール据付工事
3月中旬	最終汚水枘接続配管
	外構工事
	電気・機械設備スラブ配管
3月下旬	鉄骨建て方準備
	鉄骨仮設工事、鉄骨建て方
	デッキ搬入・張り

\*\*\*\*\* 柏原保育所周辺道路について \*\*\*\*\*  
工事関係車両の通行により交通量が増えることが予想されます。横断歩道を渡って横断ください。また、歩道の通行にはご注意ください。  
公立保育所への送迎は原則、自転車や徒歩をお願いしていますが、自動車であられて路上に駐車をされる方がいらっしゃいます。やむを得ず自動車で送迎される場合は、近隣コインパーキングをご利用ください。  
ご理解とご協力をお願いいたします。



←QRコードから(仮称) かしわら認定こども園に関する情報をご確認いただけます。

<http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2017112400015/>

お問い合わせ

柏原市役所 健康福祉部 こども政策課

TEL : 072-943-4811 FAX : 072-973-3782

E mail : kodomoseisaku@city.kashiwara.lg.jp
