



(仮称) かしわら認定こども園ニュース 第7号 こども政策課 2020.4.3



このニュースでは、(仮称) かしわら認定こども園について随時お知らせしていきます。

*** 3月の進捗状況 ***
3月の工事の様子です。ピット内部工事、土間コンクリート打設、鉄骨建て方、足場組立等がされました。

3/3



3/13




3/20




3/21



3/25

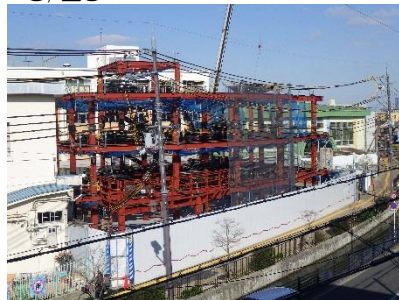

3/30

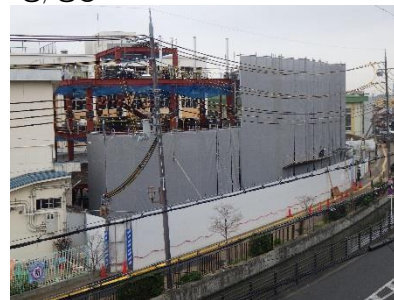

*** 4月の月間工程表 ***
月間工程表は以下のとおりです。作業進捗によって変更の可能性があります。
作業時間：8:30~18:00

4月初旬	足場組
	各階デッキ工事
	各階スタットジベル工事
4月中旬	各階配筋工事
	各階コンクリート打設工事
4月下旬	各階スラブ張り
	材料搬入

*** 柏原保育所周辺道路について ***
工事関係車両の通行により交通量が増えることが予想されます。横断歩道を渡って横断ください。また、歩道の通行にはご注意ください。
公立保育所への送迎は原則、自転車や徒歩でお願いしていますが、自動車であられて路上に駐車をされる方がいらっしゃいます。やむを得ず自動車で送迎さご理解とご協力をお願いいたします。



←QRコードから(仮称) かしわら認定こども園に関する情報をご確認いただけます。

お問い合わせ
 柏原市役所 健康福祉部 こども政策課
 TEL : 072-943-4811 FAX : 072-973-3782
 Email : kodomoseisaku@city.kashiwara.lg.jp
