



# (仮称) かしわら認定こども園ニュース 第8号 こども政策課 2020.5.11



このニュースでは、(仮称) かしわら認定こども園について随時お知らせしていきます。

\*\*\*\* 4月の進捗状況 \*\*\*\*  
4月の工事の様子です。デッキ張り、外部足場組立の完了、スラブコンクリート打設等がされました。

\*\*\*\* 5月の月間工程表 \*\*\*\*  
月間工程表は以下のとおりです。作業進捗によって変更の可能性があります。  
作業時間：8:30~18:00

5月上旬	配筋	各階スラブ脱型 各階 ALC 下地建込み 材料搬入
5月中旬	丸柱耐火塗装下地	
	各階天井配線・配管	
	エアコン吊	
5月下旬	外部・内部サッシ取付	
	外部・内部シャッター取付	
	軽鉄間仕切り組	
	岩綿吹付	
	シート防水・塗膜防水下地	
	各階軒下樋取付・換気配管	
	各階軒天下地組	
	ウレタン吹付	

\*\*\* 柏原保育所周辺道路について \*\*\*  
工事関係車両の通行により交通量が増えることが予想されます。横断歩道を渡って横断ください。また、歩道の通行にはご注意ください。  
公立保育所への送迎は原則、自転車や徒歩でお願いしていますが、自動車でもらわれて路上に駐車をされる方がいらっしゃいます。やむを得ず自動車で送迎される場合は、近隣コインパーキングをご利用ください。  
ご理解とご協力をお願いいたします。



←QRコードから(仮称) かしわら認定こども園に関する情報をご確認いただけます。

<http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2017112400015/>

お問い合わせ  
 柏原市役所 健康福祉部 こども政策課  
 TEL : 072-943-4811 FAX : 072-973-3782  
 E mail : kodomoseisaku@city.kashiwara.lg.jp

4/3



4/10




4/23



4/23



4/25

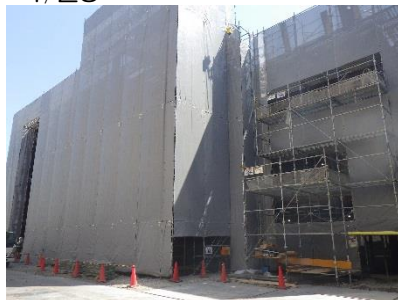

4/25

