




柏建 設通 信 新 庁 舎

令和2年度12月
令和3年度1月

Vol. 13

車寄せ庇の施工

12月から順次外構工事に取り掛かり、その外構工事の一つに車寄せ庇の工事があります。こちらの庇は、新庁舎の北側の風除室から西面中央部分にある風除室までを覆う大型の庇となっております。車の乗降場所から建物入り口まで覆うので雨の日の来庁時にも活躍します。また、車寄せ部分は市内循環バス用と、一般車用の二か所ございますので来庁の際は、一般車用の方をご利用ください。

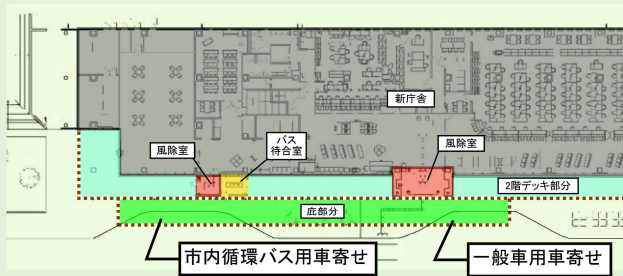

基礎配筋工事



基礎コンクリート打設後



鉄骨建方工事

天井ボード施工

天井内への機器設備の設置が済むと、天井ボード張り工事に取り掛かります。天井ボード張りは内装工事となり、建設通信Vol.11で掲載しました間仕切壁と同様に軽量鉄骨下地を組み上げ、その上から石膏ボードを貼り付けて天井の完成となります。来年度からの新庁舎運用を目指して外装工事に続いて内装工事も順次完成に向けて、スパートをかけて参ります!!

軽量鉄骨天井下地工事



天井ボード張り



OAフロア敷設

主に職員の執務スペースの床にはOAフロアという二重床になる空間を、作り出す床材を敷き詰めております。このOAフロアによって、パソコンのLANケーブルや電話線、電源タップなどを床下空間に配線することで執務スペースをスッキリとさせることができます。

また、利点としては床上の配線が支障とならないことや、設置された什器などに影響されることなく配線の変更が容易に行えることがあります。写真の様にOAフロアを敷き詰めた後、上にタイルカーペットを敷き詰めれば、床仕上げの完成となります。

OAフロア敷設状況



外装工事 完成!!

新庁舎の外装がいよいよ完成いたしました！
ライトグレーを基調とした外壁には北面と西面に連窓を取付け、大和川の眺望が望める開放的な室内空間となっております。また、外観で目を引く部分はやはり、西面全体に設置された大版の縦型ルーバーとなります。このルーバーと室内ロールスクリーンにより西日を遮蔽することで室内への日射負荷を低減し、空調効率を上げることで省エネルギー化を図り環境へ配慮した庁舎となっています。



新庁舎建設工事 令和2~3年度スケジュール



新庁舎 工 事



ししまい



かしびよん

582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 総務部庁舎整備室
TEL: 072-920-7175
E-Mail: choshaseibi@city.kashiwara.lg.jp

